

23.04.2008

Informatīvais ziņojums par pamatnostādnēm „e-Veselība Latvijā” un īstenošanas plāna 2008.-2010.gadam ieviešanu 2007.gadā

SATURS

Dokumentā izmantotie saīsinājumi.....	3
Ievads	4
1. EVK ieviešana	6
1.1. EVK IS projekta vadība un EVK IS vadlīniju izstrāde, iepirkuma sagatavošana un projekta atbalsts	6
1.2. Informācijas apmaiņas standartu noteikšana - Datu apmaiņas standartu sagatavošana	7
1.3. Integrācijas platformas (IS integrācijai) vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde	7
1.4. Datu pārraides tīkla prasību un standartu noteikšana	8
2. Vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas dienesta IS izveide, vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde un projekta atbalsts	9
3. Uzraudzības un monitoringa IS izstrāde, produktu reģistrācijas IS pilnveidošana un farmaceitiskās darbības uzraudzības IS izveidošana un esošās datu bāzes integrācija.....	10
4. Vienotas infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa IS (VISUMS) attīstība.....	11
5. Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva izveide, Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) centra vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde, projekta atbalsta nodrošināšana.....	11
6. Elektronisko recepšu ieviešana (e-prescriptions), IS vadlīniju izstrāde un iepirkumu sagatavošana	12
7. Veselības aprūpē strādājošo izglītības celšana IT jomā, mācību koordinatora pakalpojuma iepirkums.....	13
8. e-Veselības programmas pārvaldība	14
8.1. Programmas vadības vienības izveide un programmas pārvaldības atbalsts	14
8.2. uzdevums - Programmas īstenošanas gaitas uzraudzības nodrošināšana - programmas auditi	15

Dokumentā izmantotie saīsinājumi

Saīsinājums	Skaidrojums
EVK	Elektroniskā veselības karte (Electronical Health Record)
IS	Informācijas sistēma, kas izstrādāta atbilstoši 2006.gada 25.maijā Veselības ministrijas IT padomē apstiprinātajam dokumentam „Veselības aprūpes nozares informācijas sistēmu arhitektūra”
IT	Informācijas tehnoloģija
ĪUMEPLS	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta
KM	Katastrofu medicīna
KMC	Katastrofu medicīnas centrs
MPIC	Medicīnas profesionālās izglītības centrs
NMP	Neatliekamā medicīniskā palīdzība
PSKUS	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
SVA	Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”
VI	Veselības inspekcija
VM	Veselības ministrija
VOAVA	Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra
VSMTVA	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
ZCVA	Zāļu cenu valsts aģentūra
ZVA	Zāļu valsts aģentūra

Ievads

Izpildot 2005.gada 17.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.560 „Par pamatnostādņēm „e-Veselība Latvijā” (turpmāk - Pamatnostādnes) 3.punktu, tika izstrādāts pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008.-2010.gadam (turpmāk - Plāns), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.660.

Plānā ir nosaukti visi Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamie pasākumi, lai arī daļai no tiem šobrīd nav nepieciešamā finansējuma. Tas dod iespēju nākotnē meklēt papildus finansēšanas avotus.

Lai sasniegtu Plānā izvirzītos mērķus – nodrošināt indivīdam pieejamu informāciju par veselības stāvokli; paaugstināt veselības aprūpes efektivitāti un kvalitāti; nodrošināt augsti kvalificētu ārstu konsultāciju pieejamību visā Latvijas teritorijā; nodrošināt iespēju veselības aprūpes politikas noteikšanu, plānošanu, īstenošanu un kontroli balstīt uz kvalitatīvu informāciju par situāciju veselības aprūpē – ir noteikti septiņi galvenie pasākumi:

- EVK ieviešana;
- ārstniecības iestāžu datorizācija, elektroniskās slimības vēstures ieviešana;
- veselības aprūpes pārvaldes funkciju (iestāžu) datorizācija;
- diagnostikas elektronizācija un telemedicīnas attīstība;
- veselības aprūpes darba plūsmu elektronizācija;
- nozares e-gatavības veicināšana;
- e-Veselības programmas pārvaldība.

Plāna īstenošanas procesa nodrošināšanai ļoti būtiska ir VM un citu ministriju, un institūciju starpnozaru sadarbība. Plāna ietvaros veikto aktivitāšu nozīmi un ieguldījumu sabiedrības veselības uzlabošanā, būs iespējams izvērtēt ilgtermiņā.

Plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums ir iekļauts aktualizētajā VM darbības stratēģijā 2007.-2009.gadam.

Plāna finansējuma avots ir likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētie līdzekļi. Plāna īstenošanu 2007.gadā institūcijas veica piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros - 681 800 LVL apmērā. Lai nodrošinātu Plāna mērķu sasniegšanu, sākot ar 2008.gadu Plāna pasākumu īstenošanai nepieciešams papildus finansējums. Jautājums par Plānam nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta pieprasījumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

Pamatnostādņēs bija paredzēts sākt pasākumu izpildi 2006.gadā, taču Plāns tika apstiprināts 2007.gadā un tajā atspoguļoto pasākumu izpilde paredzēta no 2008.gada. Tā kā 2007.gadā tika piešķirts finansējums Pamatnostādņēs

noteikto pasākumu realizācijai, tad Plānā paredzēto 2008.gadā veicamo pasākumu izpilde ir sākta 2007.gadā.

Šajā informatīvajā ziņojumā sniegts pārskats par Pamatnostādņu ieviešanas Plānā noteikto pasākumu īstenošanu 2007.gadā un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Atskaites periodā notikusi Plāna izpildē iesaistīto iestāžu reorganizācija. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.432 „Par Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu”, VI ir rīkojumā minēto iestāžu funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja. Ziņojumā minēts jaunizveidotās iestādes nosaukums.

1. EVK ieviešana

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 337 350 LVL, izlietoti - 321 199,28 LVL.

1.1. EVK IS projekta vadība un EVK IS vadlīniju izstrāde, iepirkuma sagatavošana un projekta atbalsts

Plānā – pasākums Nr.1.1.1. un 1.1.2. (atbildīgā institūcija - VSMTVA)

2007.gada jūnijā tika sagatavots konkursa nolikums par konsultantu piesaisti EVK IS prasību izstrādei, ko apstiprināja VSMTVA iepirkumu komisija, un izsludināts konkurss.

2007.gada 25.septembrī noslēgts līgums ar SIA „AA Projekts” par EVK IS vadlīniju izstrādi.

No 2007.gada oktobra līdz decembrim ir notikušas 24 intervijas ar pārstāvjiem no VM, KMC, Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas, PSKUS, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, SIA „Ernst & Young Baltic”, ZVA, VI, Dr. Ķilkuta ģimenes ārstu privātprakses, VOAVA, SIA „Veselības centrs 4”, SVA, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, ZCVA, Medicīnisko firmu SIA „Dziedniecība”, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Māsu arodbiedrības, SIA „Vidzemes slimnīca”, ĪUMEPLS un Latvijas Ārstu biedrības.

2007.gada 06.novembrī e-Veselības projektu vadības darba grupas sanāsmē VM tika prezentēta SIA „AA Projekts” vīzija par EVK IS izstrādātajām prasībām.

2007.gada decembrī uzsākts SIA „AA Projekts” iesniegto nodevumu melnraksta versiju izskatīšanas un apspriedes process:

- 1) EVK IS vīzija;
- 2) EVK IS darbināšanas vadlīnijas;
- 3) Tehniskā specifikācija (1. sējums - vārdnīca, 2. sējums - EVK IS konceptuālā arhitektūra, 3. sējums - prasību specifikācija, 4. sējums - darba uzdevums, 5. sējums - risku un atkarību novērtējums);
- 4) Līguma projekts par IS izstrādi;
- 5) Līguma projekts par standarta programmatūras tehniskā nodrošinājuma piegādi;
- 6) Līguma projekts par IS un lietojumprogrammatūras apkalpošanu un uzturēšanu pēc izstrādes beigām;
- 7) Līgumu paraugi informācijas apmaiņai starp pasūtītāju un atsevišķām ārstniecības iestādēm par pieejas nodrošināšanu centralizēti uzkrātajai

informācijai, par personas datu saņemšanu un apstrādi, par centralizētu klasifikatoru un references datu uzturēšanu.

Gala versija nodevumu saskaņošanai tiks iesniegta līdz 2008.gada 31.martam. Dokumentu saskaņošanas termiņš - 14 dienas katram dokumentam.

1.2. Informācijas apmaiņas standartu noteikšana - Datu apmaiņas standartu sagatavošana

Plānā – pasākums Nr.1.2.3. (atbildīgā institūcija - VSMTVA)

2007.gada oktobrī tika sagatavots konkursa nolikums par konsultantu piesaisti informācijas apmaiņas standartu prasību izstrādei, ko apstiprināja VSMTVA iepirkumu komisija, un izsludināts konkurss.

2007.gada 9.novembrī noslēgts līgums ar SIA „Metrika” par informācijas apmaiņas standartu izstrādi.

2007.gada decembrī notikušas intervijas ar PSKUS, Valsts asinsdonoru centra, ZVA, VI, SVA, VSMTVA, VOAVA, KMC, Latvijas Māsu asociācijas, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, Medicīnisko firmu SIA „Dziedniecība”, SIA „Veselības centrs 4”, SIA „Latvijas Standarts” pārstāvjiem un ģimenes ārstiem Gunti Ķilkutu un Sarmīti Veidi.

Līdz 2008.gada 18.martam SIA „Metrika” iesniegs Datu apmaiņas standartu projekta nodevumu tālākā standartizācijas procesa uzsākšanai klasifikatoru, reģistru un terminu vārdnīcu lietošanas jomā, kā arī likumdošanas izmaiņu izstrādei, t.i.:

- 1) Priekšlikumus informatīvajam paziņojumam par standartu izstrādi;
- 2) Priekšlikumus izmaiņām esošajā likumdošanā, standartu izmantošanai;
- 3) Standartizācijas uzdevumu ieviešanas stratēģiju;
- 4) Standartizācijas uzdevumu ieviešanas plānu;
- 5) Standartizācijas uzdevumu ieviešanas finanšu novērtējumu;
- 6) Kontrolēto medicīnas terminu vārdnīcu;
- 7) Centrālo klasifikatoru reģistru;
- 8) Prasības centrālo klasifikatoru uzturētājiem.

Dokumentu nodevumus ir plānots saskaņot līdz 2008.gada 11.aprīlim.

1.3. Integrācijas platformas (IS integrācijai) vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde

Plānā – pasākums Nr.1.3.1. (atbildīgā institūcija - VSMTVA)

2007.gada jūlijā tika sagatavots konkursa nolikums par konsultantu piesaisti Integrācijas platformas prasību izstrādei, ko apstiprināja VSMTVA iepirkumu komisija, un izsludināts konkurss.

2007.gada 9.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „AA Projekts” par Integrācijas platformas vadlīniju izstrādi.

No 2007.gada oktobra līdz decembrim ir notikušas 24 intervijas ar pārstāvjiem no VM, KMC, Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas, PSKUS, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, SIA „Ernst & Young Baltic”, ZVA, VI, Dr. Ķilkuta ģimenes ārstu privātprakses, VOAVA, SVA, SIA „Veselības centrs 4”, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, Medicīnisko firmu SIA „Dziedniecība”, ZCVA, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Māsu arodbiedrības, SIA „Vidzemes slimnīca”, ĪUMEPLS un Latvijas Ārstu biedrības.

2007.gada 6.novembrī e-Veselības projektu vadības darba grupas sanāsmē VM tika prezentēta SIA „AA Projekts” vīzija par integrācijas platformas izstrādātajām prasībām.

2007.gada decembrī uzsākts SIA „AA Projekts” iesniegtā nodevuma melnraksta versijas izskatīšanas un apspriedes process.

Nodevuma gala versija tiks iesniegta līdz 2008.gada 8.aprīlim.

1.4. Datu pārraides tīkla prasību un standartu noteikšana

Plānā – pasākums Nr.1.3.4. (atbildīgā institūcija - VSMTVA)

2007.gada novembrī tika sagatavots konkursa nolikums par konsultantu piesaisti datu pārraides tīkla prasību un standartu noteikšanas prasību izstrādei, ko apstiprināja VSMTVA iepirkumu komisija, un izsludināts konkurss.

2007.gada 21.decembrī noslēgts līgums ar SIA „Corporate Solutions” par datu pārraides tīkla prasību un standartu izstrādi.

2008.gadā plānots organizēt intervijas ar VOAVA, VZA, SVA, KMC, Valsts asinsdonoru centru, PSKUS, VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA „Vidzemes slimnīca”, SIA „Veselības centrs 4”, Medicīnas sabiedrību „ARS”, Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju, E. Gulbja laboratoriju un VM; uzsākta visu Latvijas ārstniecības iestāžu elektroniskā anketēšana par veselības aprūpes organizāciju vajadzībām saistībā ar datu pārraidi.

SIA „Corporate Solutions” nodevumu par datu pārraides tīkla prasību un standartu izstrādi plānots saskaņot līdz 2008.gada 21.maijam.

2. Vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas dienesta IS izveide, vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde un projekta atbalsts

Plānā – pasākums Nr.3.1.1. (atbildīgā institūcija - KMC)

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 84 000 LVL, izlietoti - 84 000 LVL.

2007.gadā:

- 1) no janvāra līdz martam veikta vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādes situācijas izpēte, viedokļu apkopošana, risku analīze, risinājumu izvērtēšana un ieviešanas plānošana;
- 2) 17.martā KMC izveidota iepirkuma komisija iepirkumam par vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādi un vienota NMP un KM dienesta IS iepirkuma sagatavošanu;
- 3) 25.maijā izsludināts konkurss par vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādi un vienota NMP un KM dienesta IS iepirkuma sagatavošanu;
- 4) 25.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „Ernst & Young Baltic” par vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādi un vienota NMP un KM dienesta IS iepirkuma sagatavošanu;
- 5) 31.jūlijā ar VM rīkojumu izveidota darba grupa, kuras sastāvā apstiprināti pārstāvji no VM, KMC, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jelgavas pašvaldības, SVA, VOAVA, Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Darba grupa izveidota ar mērķi nodrošināt vienota NMP un KM dienesta izveidošanu. Darba grupai notika piecas sēdes;
- 6) no augusta līdz septembrim veiktas 28 intervijas ar KMC un NMP dienestu darbiniekiem;
- 7) 13.septembrī organizēts seminārs KMC speciālistiem „Vienota NMP un KM dienesta izveides pamatprincipu un IS vīzijas noteikšana”, ar mērķi apzināt un precizēt vienota NMP un KM dienesta izveides jautājumus, kas ir būtiski vienota NMP un KM dienesta IS izveidē, kā arī izdiskutēt un saskaņot vienota NMP un KM dienesta IS izveides pamatnostādnes. Seminārā piedalījās 20 pārstāvji;
- 8) 12.oktobrī darba grupa pabeidza darbu pie vienota NMP un KM dienesta detalizēta ieviešanas plāna izstrādes, kurā aprakstīta vienota NMP un KM dienesta izveides administratīvi juridiskā procedūra, cilvēkresursu nodrošinājums, infrastruktūras izveide, IS izstrāde, kā arī pētījumu un sabiedrības informēšanas pasākumu laika un finanšu plānojums;
- 9) 18.oktobrī SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza vienota NMP un KM dienesta IS vīziju un vadlīnijas saskaņošanai;

- 10) oktobrī un novembrī tika organizētas papildus intervijas IS funkcionālo prasību precizēšanai ar potenciālajiem IS lietotājiem;
- 11) novembrī un decembrī vienota NMP un KM dienesta IS vadlīnijas tiek prezentētas sadarbības projektu vadībai - VSMTVA, VM;
- 12) 29.oktobrī SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza saskaņošanai iepirkuma par vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādi līguma projektu;
- 13) 27.novembrī SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza saskaņošanai iepirkuma par vienota NMP un KM dienesta IS vadlīniju izstrādi dokumentāciju;
- 14) 10.decembrī SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza KMC sagatavotos nodevumus:

- 1) vienota NMP un KM dienesta IS izveides pamatnostādnes un vīzija;
- 2) komentāri/atbildes uz projekta „e-Veselība Latvijā” vadības grupas jautājumiem par vienota NMP un KM dienesta IS izveides vadlīnijām;
- 3) vienota NMP un KM dienesta IS vadlīnijas;
- 4) iepirkuma dokumentācija konkursam „Vienota NMP un KM dienesta IS izveide, ieviešana un uzturēšana”
- 5) iepirkuma dokumentācija konkursam „Fiksēto telekomunikāciju sakaru nodrošinājums”;
- 6) iepirkuma dokumentācija konkursam „Vienotā datu pārraides tīkla ieviešana un uzturēšana”.

- 15) 13.decembrī SIA „Ernst & Young Baltic” prezentēja VM vienota NMP un KM dienesta IS izveides vīziju un pamatnostādnes, īpašu uzmanību veltot NMP iestāžu rīcībā esošās programmatūras izvērtējumam.

SIA „Ernst & Young Baltic” vienota NMP un KM dienesta IS vadlīnijas plānots saskaņot ar citiem Plāna pasākumiem līdz 2008.gada 31.maijam.

3. Uzraudzības un monitoringa IS izstrāde, produktu reģistrācijas IS pilnveidošana un farmaceitiskās darbības uzraudzības IS izveidošana un esošās datu bāzes integrācija

Plānā – pasākums Nr.3.3.1., 3.3.2. un 3.3.3. (atbildīgā institūcija - VI)

2007.gadā:

- 1) uzsākta Uzraudzības monitoringa IS izstrāde – uzrakstīta un apstiprināta tehniskā specifikācija, organizēta sarunu procedūra par IS izstrādi, noslēgts līgums ar pretendentu grupu par IS pirmās kārtas izstrādi.
- 2) turpināta Kosmētikas līdzekļu un tabakas izstrādājumu reģistrācijas IS izstrāde – funkcionalitātes pilnveidošana un kļūdu labošana, nodrošināta

savienošanas iespēja ar LRAPEX (Latvijas iekšējā ātrās paziņošanas sistēma par bīstamām precēm) IS un Valsts ieņēmumu dienesta IS, uzsākta laboratorisko izmeklējumu moduļa izveide, izveidots modulis tiešsaistes pieejas nodrošināšanai uzņēmumiem, tai skaitā elektroniskai informācijas sniegšanai, aktualizēšanai un datu apmaiņai ar VI, izstrādātas datu drošības prasības, kas nodrošinātu klientiem iespēju redzēt tikai tos datus, kurus aplūkot ir tiesīgs katrs konkrētais lietotājs.

Pasākums veikts no VI budžeta līdzekļiem.

4. Vienotas infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa IS (VISUMS) attīstība

Plānā – pasākums Nr.3.4. (atbildīgā institūcija - SVA)

Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēmas (VISUMS) darbības mērķu sasniegšanai 2007.gadā ir veikts programmatūras „Oracle Discoverer” licenču uzturēšanas pagarinājuma iepirkums.

Pasākums veikts no SVA budžeta līdzekļiem.

5. Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva izveide, Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) centra vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde, projekta atbalsta nodrošināšana

Plānā – pasākums Nr.4.1.1. (atbildīgā institūcija - PSKUS)

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 100 000 LVL, izlietoti - 99 886,69 LVL.

2007.gada aprīlī darbu uzsāka PSKUS iepirkumu komisija konkursa nolikuma par konsultantu piesaisti nacionālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva prasību izstrādei. Notika četras komisijas sēdes.

2007.gada 26.jūlijā tika apstiprināts konkursa nolikums un izsludināts konkurss.

2007.gada 16.novembrī noslēgts līgums ar SIA „Ernst & Young Baltic” par nacionālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva izveidi.

2007.gada 18.decembrī noslēgts līgums ar SIA „AA Projekts” par datu centra un aparatūras risinājuma tehniskās specifikācijas izstrādi.

2007.gada decembrī ir uzsāktas intervijas ar PSIA „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers””, SIA „Vidzemes slimnīca”, Pašvaldības SIA „Ventpils slimnīca”, SIA „Veselības centrs 4”, Latvijas Rentgenologu un radiologu asociāciju, VOAVA, VM, SIA „Kuldīgas slimnīca”, SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, PSKUS radiologiem un iespējamajiem risinājumu piegādātājiem – SIA „Siemens”, SIA „NMS Grupa”, SIA „Arbor”, SIA „Amerilat MD”, SIA

„Lattelekom”. Ārvalstu pieredzes apzināšanai tika apmeklēta Igaunija un intervēti Igaunijas e-Veselības fonda (Estonian e-Health Foundation) pārstāvji.

2007.gada 11.decembrī SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza nacionālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva IS vīzijas dokumentu, uz kura pamata tiks izstrādātas vadlīnijas.

Vadlīniju un iepirkuma dokumentācijas nodevumu plānots iesniegt līdz 2008.gada 31.martam. Dokumentu saskaņošanas termiņš - 10 dienas.

6. Elektronisko recepšu ieviešana (e-prescriptions), IS vadlīniju izstrāde un iepirkumu sagatavošana

Plānā – pasākums Nr.5.1.1. (atbildīgā institūcija - ZVA)

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 100 000 LVL, izlietoti - 97 680,40 LVL.

2007.gada maijā darbu uzsāka ZVA iepirkumu komisija. No maija līdz novembrim notika 11 sēdes.

Konkursa nolikuma par konsultantu piesaisti elektronisko recepšu IS vadlīniju un projekta ieviešanas atbalsta prasību izstrādei 2007.gada 11.maijā tika apstiprināta ekspertu darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no ZVA, VM, VI un ZCVA. Darba grupai notika trīs sēdes.

2007.gada 8.jūnijā tika sagatavots konkursa nolikums un izsludināts konkurss.

2007.gada 27.novembrī noslēgts līgums ar SIA „AA Projekts” par elektronisko recepšu IS vadlīniju izstrādi un projekta ieviešanas atbalstu.

2007.gada 5.decembrī tika izveidota projekta pārraudzības padome, kuras sastāvā tika iekļauti VM, ZVA un ZCVA pārstāvji. Padome paredzēta, lai uzraudzītu projekta gaitu, novērtētu projekta attīstības atbilstību plānotajam, lemtu par koriģējošiem pasākumiem, uzņemtos atbildību par lēmumiem attiecībā uz projekta izmaiņu veikšanu. Padomei notika trīs sēdes.

2007.gada 19.decembrī SIA „AA Projekts” ZVA iesniedza:

- 1) IS atbalstāmo esošo un nākotnes pārvaldes procesu aprakstus;
- 2) elektroniskās recepšu IS vadlīnijas;
- 3) iepirkuma dokumentāciju.

Augstāk minētos dokumentus plānots salīdzināt ar citiem uzsāktajiem Plāna pasākumiem un nodot pasūtītājam līdz 2008.gada 18.aprīlim.

7. Veselības aprūpē strādājošo izglītības celšana IT jomā, mācību koordinatora pakalpojuma iepirkums

Plānā – pasākums Nr.6.2.6. (atbildīgā institūcija - MPIC)

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 38 450 LVL, izlietoti - 38 450 LVL.

2007.gadā:

- 1) 31.augustā MPIC izveidota e-Veselības struktūrvienība un nostiprināta tās darbība;
- 2) 14.septembrī izstrādāta anketa veselības aprūpē strādājošo darba devēju viedokļa noskaidrošanai;
- 3) 28.septembrī apzināti potenciālie pilotgrupas izglītojamie un noteiktas mācību vajadzības, noteikta mācību pilotgrupa;

Pilotgrupa tika atlasīta no reģionālajām, lokālajām daudzprofilu slimnīcām un specializētajiem centriem, tai skaitā, ārstniecības iestādēm, kuras MPIC veiktajā aptaujā par tālākizglītības vajadzībām izteikušas vēlmi darbinieku datorprasmju paaugstināšanā vai iegūšanā, lai tiktu pārstāvēti dažādi Latvijas reģioni, ārstniecības personāls un citi veselības aprūpē strādājošie;

- 4) 26.oktobrī noteikts mācību saturs un izstrādāti mācību materiāli, apzināti potenciālie izglītotāji un noteiktas mācību vietas (Rīgā, Aizkrauklē, Alūksnē, Jūrmalā, Preiļos, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī);

19.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” par veselības aprūpē strādājošo apmācību vispārējo IT prasmju apgūšanai.


- 5) 16.novembrī izstrādātas IT prasmju novērtēšanas metodes;
- 6) 27.novembrī apkopoti dati un sagatavoti pārskati par reģionālajās, lokālajās daudzprofilu slimnīcās un arī specializētajos centros strādājošo prasmju līmeni IT jomā, noteikti turpmākie mērķi un uzdevumi izglītības celšanai.

Ir noskaidrots, ka apmācība IT pamatzināšanās nepieciešama 1545 ārstniecības iestādēs strādājošajiem, padziļināta IT apmācība nepieciešama 1270 darbiniekiem un apmācība darbam ar specifiskiem IT produktiem – 306.

- 7) 21.decembrī pabeigts izglītēt mācību pilotgrupu - 110 veselības aprūpē strādājošos no Rīgas un Latvijas rajoniem, un veikta apgūto informācijas tehnoloģiju prasmju un mācību norises novērtēšana.

Izglītojamie apguva datora lietošanas pamatus un internetu (arī e-pakalpojumu izmantošanu).

Apmācītās ārstniecības personas 27.11-21.12.2007.

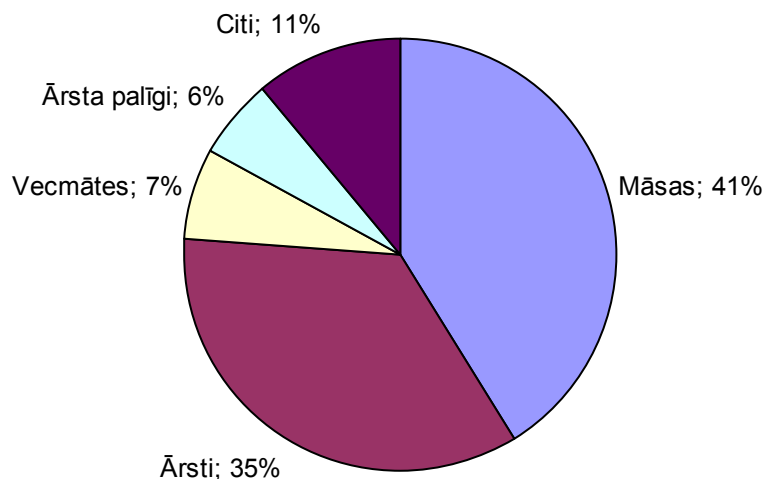

8. e-Veselības programmas pārvaldība

2007.gadā pasākuma īstenošanai piešķirti 22 000 LVL, izlietoti - 22 000 LVL.

8.1. Programmas vadības vienības izveide un programmas pārvaldības atbalsts

Plānā – pasākums Nr.7.1.2. un 7.1.3. (atbildīgā institūcija - VM)

2007.gada 28.maijā darbu uzsāka e-Veselības nodaļa.

Izpildot 2005.gada 17.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.560 „Par pamatnostādņēm „e-Veselība Latvijā” 3.punktu, tika izstrādāts pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008.-2010.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2007.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.660.

2007.gada 23.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Ernst & Young Baltic” par e-Veselības projekta un apakšprojektu īstenošanas kārtības un e-Veselības projekta darba grupas nolikuma sagatavošanu.

Nodevumu SIA „Ernst & Young Baltic” iesniedza VM 2007.gada 25.septembrī.

2007.gada 9.oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA „Check IT” par VM IS dokumentācijas sagatavošanu.

Nodevumu SIA „Check IT” iesniedza VM 2007.gada 19.decembrī.

Līdz 2007.gada decembra beigām ir:

- 1) sagatavots VM iekšējais normatīvais akts „e-Veselības projekta un apakšprojektu īstenošanas kārtība”;
- 2) sagatavots VM iekšējais normatīvais akts „e-Veselības projekta darba grupas nolikums”;
- 3) sagatavots VM rīkojums „Par darba grupas izveidi”;
- 4) sakārtota VM IS dokumentācija.

8.2. uzdevums - Programmas īstenošanas gaitas uzraudzības nodrošināšana - programmas auditi

Plānā – pasākums Nr.7.2.1. (atbildīgā institūcija - VM)

2007.gada 31.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „Pro Technologies” par atzinuma sagatavošanu par pamatnostādņēm „e-Veselība Latvijā”.

Nodevumu SIA „Pro Technologies” iesniedza VM 2007.gada 14.decembrī.

Izstrādātajā atzinumā tika apskatīta Pamatnostādņu īstenošana, uzsākot realizēt Plāna 1.1.2., 1.3.1., 3.1.1., 4.1.1. un 5.1.1. pasākumus. Būtiski atzīmēt, ka viena no atzinumā iekļautajām rekomendācijām tika ņemta vērā rakstot vadlīnijas, t.i., vairāk uzmanības veltīt biznesa procesu aprakstam.

Veselības ministrs

I. Eglītis

14.04.2008 10:37

3089

I. Vanaga

Ineta.Vanaga@vm.gov.lv, 67876009
